
Инициация и интеграция

Лекция 4

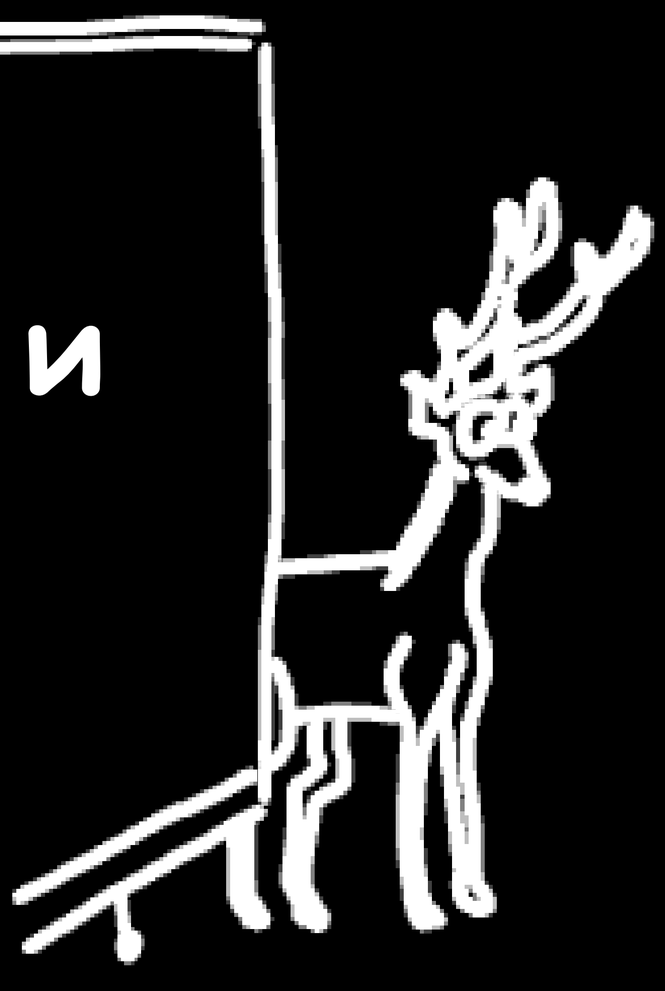

Борис А. Климов

Кто и на каком основании имеет право тратить ресурсы на проект?

Инициация превращает идею в обязательство

Проблема сформулирована

Ценность и альтернативы рассмотрены

Полномочия назначены

Ресурсы разрешено использовать

Обоснование проекта отвечает на вопрос «зачем»

Проблема подтверждена фактами

Альтернативы сравниваются

Ожидаемые выгоды измеримы

Цена бездействия понятна

Устав отвечает на вопрос «что разрешено»

Цель и результат

Границы и ограничения

Ключевые роли и полномочия

Основные вехи и критерии успеха

Цель, результат и показатель различаются

Цель описывает желаемое изменение

Результат можно передать

Показатель позволяет проверить изменение

Ограничение задает допустимую цену

Допущение требует проверки

Оно принято без полного доказательства

Имеет владельца проверки

Имеет срок подтверждения

При опровержении меняет план

Ограничение нельзя устранить решением команды

Фиксированная дата

Предельный бюджет

Обязательная технология

Правовое требование

Система принятия решений входит в устав

Кто авторизует проект


Кто принимает продуктовые решения

Кто меняет базовые планы

Кто допускает к эксплуатации

Интеграция связывает все планы

ИНТЕГРАЦИЯ = СОГЛАСОВАННОСТЬ СВЯЗАННЫХ ПЛАНОВ

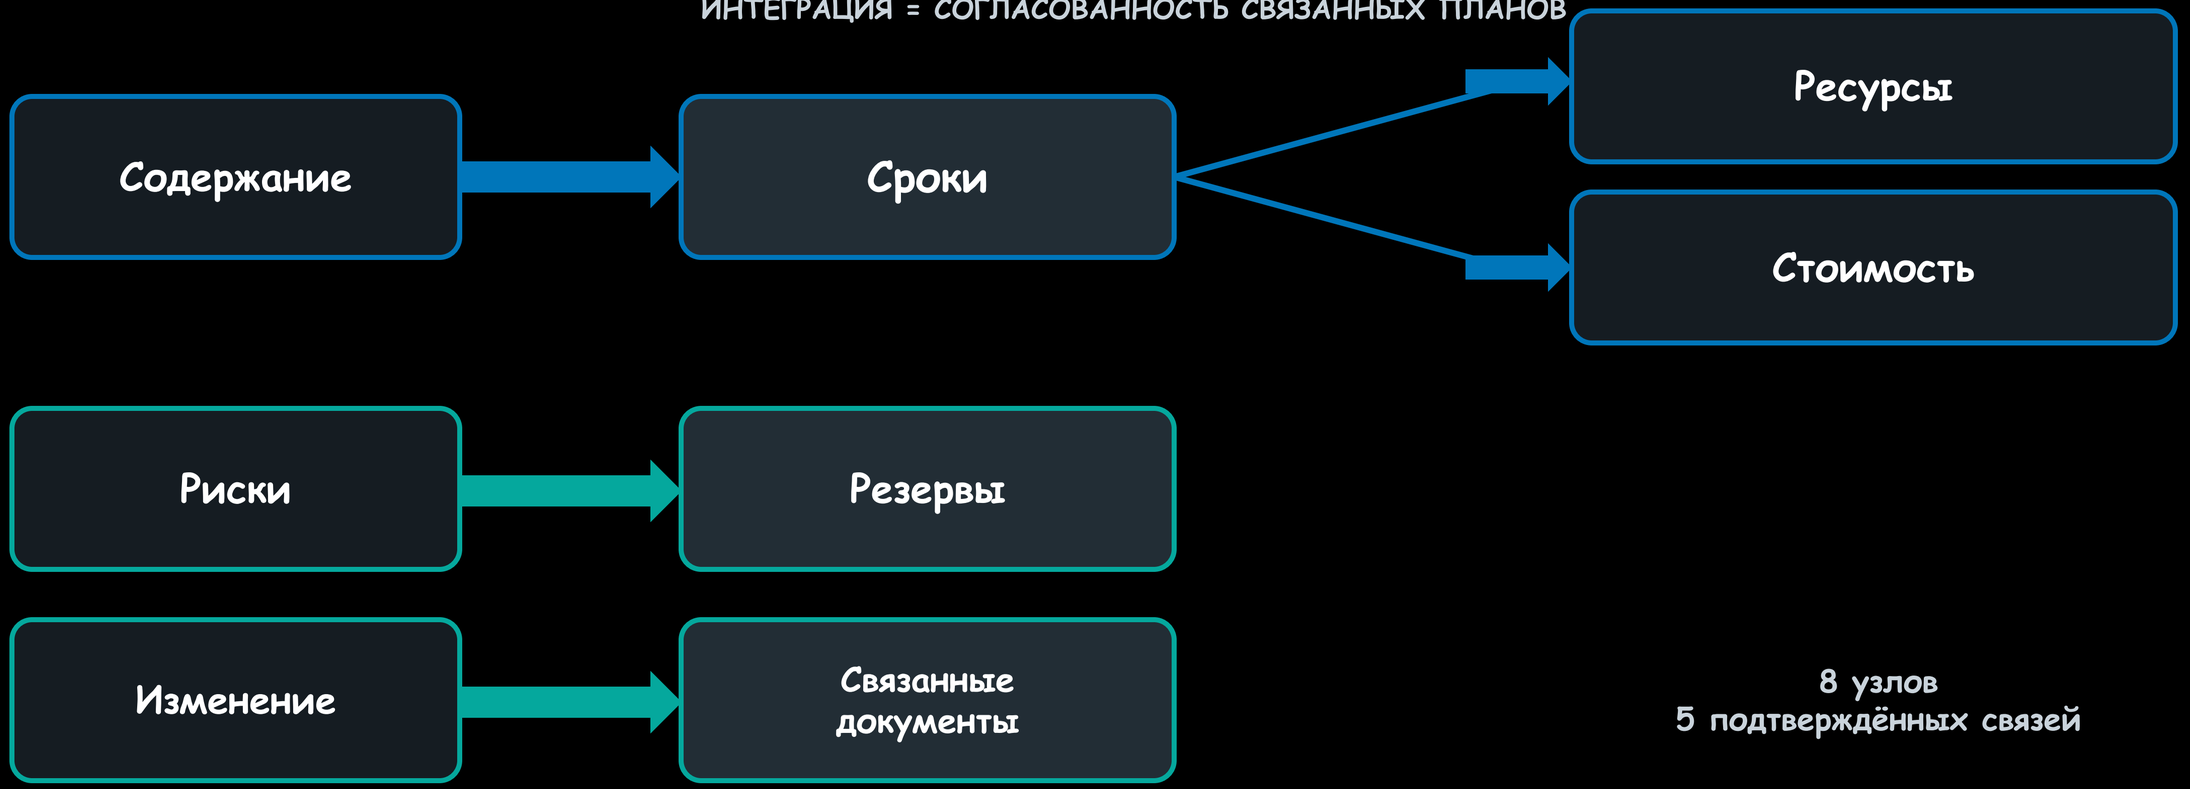

8 узлов
5 подтверждённых связей

От идеи к авторизованному проекту

Проблема должна быть наблюдаемой

Назван затронутый процесс

Есть исходное состояние

Показана потеря или ограничение

Не подменяется заранее выбранным решением

Альтернативы защищают от преждевременного выбора

Ничего не делать

Изменить процесс без разработки

Купить готовое решение

Разработать собственное решение

Экономическая логика фиксируется до плана

Стоимость создания

Стоимость эксплуатации

Ожидаемые выгоды

Риски и диапазон оценки

Устав задаёт разрешённые границы

Проблема и ценность, результат и границы.

Вехи, существенные риски и критерии успеха.

Полномочия и основания разрешения проекта.

Для С04: одна–две читаемые страницы.

Полномочия руководителя проекта ограничены

Управляет согласованным планом

Запрашивает и координирует ресурсы

Готовит решения по изменениям

Эскалирует выход за границы

Базовые планы фиксируют договоренность

Содержание

Расписание

Стоимость

Критерии качества и приемки

Журналы сохраняют память проекта

Журнал решений

Журнал допущений

Журнал изменений

Журнал проблем

На экзамене проверяется авторизация

Есть ли обоснование

Кто выдал полномочия

Какие границы установлены

Как измеряется успех

Формируем первую контрольную точку

Исходные условия новой попытки UniFlow

Полное описание кейса содержит историю, участников и краткую справку.

Пилот: 2 направления, 500 студентов, 60 руководителей, 6 администраторов.

Предел бюджета — 4,8 млн рублей, желаемый пилот — 1 декабря.

Рекомендация по авторизации готовится на С04.

Граница UniFlow включает функции и исключения

Входит: регистрация команд, контрольные точки, обратная связь, панель координатора

Не входит: проверка на заимствования и итоговые оценки

Не входит: нативное мобильное приложение и полные тексты работ

Не входит: внедрение во всём университете

Шесть решений распределяются заранее

Авторизация проекта — Куратор
Изменение приоритета содержания — Владелец продукта
Изменение базовой даты — Куратор
Допуск к опытной эксплуатации — Эксплуатация
Принятие риска информационной безопасности — Информационная безопасность
Приёмка результата — Куратор

Контрольная точка 1

Вывод о проблеме и критерии успеха из C01.

Полномочия и обращения из C02.

Выбранные правила работы из C03.

Сравнение альтернатив и устав C04 на одной–двух читаемых страницах.

C04: обоснование и разрешённые границы

Сравните четыре альтернативы из общей вводной.

Запишите неизвестные основания оценки вместо выдуманных цен.

Подготовьте устав на одной–двух читаемых страницах.

Используйте полномочия C02 и подход C03 без повторного переписывания.

Контрольные вопросы

Чем обоснование отличается от устава?

Как проверить допущение?

Кто меняет ограничение?

Зачем нужен базовый план?

Итог: инициация создает право на проект

Обоснование подтверждает смысл

Устав авторизует действие

Полномочия ограничивают ответственность

Интеграция сохраняет согласованность

Словарь занятия

Обоснование проекта — почему проект следует выполнять

Устав проекта — разрешение начать проект и его границы

Допущение — непроверенный факт, принятый для планирования

Ограничение — условие, сужающее допустимые решения

Вопросы?

