

Жизненный цикл и выбор подхода

Лекция 3



Когда подробный план снижает риск, а
когда лишь создает иллюзию контроля?

Жизненный цикл описывает путь результата

Начало и завершение имеют критерии

Фазы связаны решениями и проверками

Продуктовый цикл шире проектного

Подход определяет способ прохождения пути

Характеристика жизненных циклов

ПОДХОД	ТРЕБОВАНИЯ	ДЕЙСТВИЯ	ПОСТАВКА	ЦЕЛЬ
Предиктивный	Фиксированные	Выполняются один раз за весь проект	Одна	Управление стоимостью
Итеративный	Динамические	Повторяются, пока не будет правильно	Одна	Правильность решения
Инкрементальный	Динамические	Выполняются один раз для конкретного инкремента	Частые более мелкие поставки	Скорость
Гибкий	Динамические	Повторяются, пока не будет правильно	Частые небольшие поставки	Ценность для клиента через частые поставки и обратную связь

Прогнозируемая модель полезна при устойчивости

Результат можно описать заранее

Цена изменения высока

Зависимости известны

Приемка формализована

Итерационная работа уточняет решение

Одна и та же часть улучшается повторно

Каждый цикл дает новую информацию

Обратная связь меняет конструкцию

Критерии качества сохраняются

Инкрементальная работа наращивает результат

Каждая часть добавляет полезную способность

Результат растет по частям

Интеграция выполняется регулярно

Приемка возможна по приращениям

Адаптивный подход связывает цикл с решением

Короткий горизонт детализирован

Дальний горизонт остается укрупненным

Приоритет меняется по фактам

Ценность проверяется регулярно

Гибрид разделяет разные типы неопределенности

Дата и обязательные проверки фиксированы

Функции уточняются итерационно

Интеграции синхронизируются по вехам

Единый план показывает зависимости

Цена обратной связи определяет длину цикла

Позднее обнаружение увеличивает переделку

Частая проверка требует времени участников

Автоматизация снижает стоимость проверки

Критичные решения проверяются раньше

Scrum задаёт минимальный эмпирический контур

Прозрачность, проверка и адаптация

Владелец продукта отвечает за максимизацию ценности

Разработчики создают пригодный инкремент

Скрам-мастер обеспечивает понимание и результативность Scrum



Как выбрать ритм и
глубину планирования

Изменчивость требований влияет на подход

Низкая изменчивость поддерживает подробный план

Высокая изменчивость требует коротких проверок

Причина изменения важнее его количества

Изменчивость нужно наблюдать, а не предполагать

Цена позднего изменения задает контрольные точки

Архитектура проверяется до массовой разработки

Безопасность — до опытной эксплуатации

Договорные ограничения — до закупки

Интеграция — до накопления зависимостей

Обратная связь должна быть доступна

Пользователь способен проверить результат

Критерии проверки понятны

Результат можно показать безопасно

Решение по итогам проверки принимается быстро

Интеграционный риск требует синхронизации

Внешние окна ограничивают частоту проверки

Контракты интерфейсов фиксируются

Заглушки снижают зависимость

Полная проверка выполняется по расписанию

Регуляторные требования фиксируют минимум

Обязательные документы нельзя отменить

Контрольные доказательства готовятся заранее

Решения должны быть прослеживаемы

Внутри рамки возможна адаптивная разработка

Зрелость команды ограничивает свободу

Самоорганизация требует компетенций

Прозрачность требует дисциплины данных

Владелец продукта должен быть доступен

Слабая команда нуждается в более частых проверках

Адаптация подхода должна быть явной

Выбранные практики связаны с рисками

Исключения имеют обоснование

Ритм проверок закреплён

Модель пересматривается по наблюдениям

На экзамене обосновывайте режим работы

Назовите фактор контекста


Выберите подход или сочетание

Определите точки обратной связи

Укажите, что остается фиксированным

Собираем подход для UniFlow

**Вкуснятина!
А ты уверен, что
он отрастает снова?**

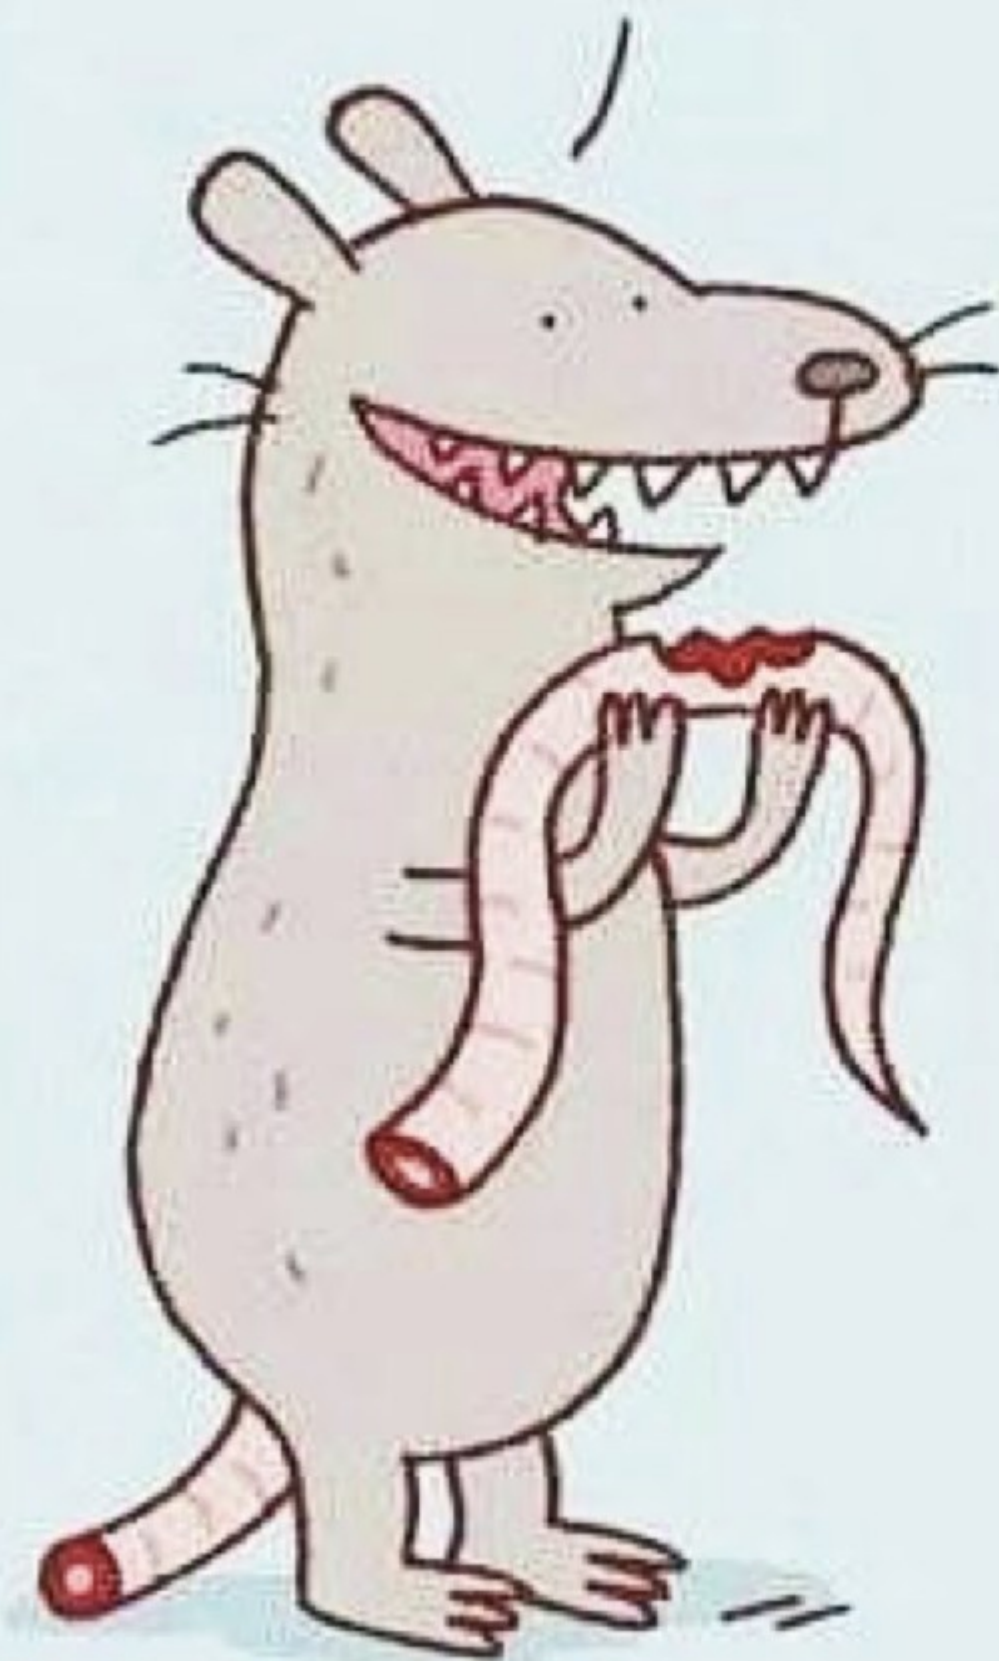

Каждый раз!



И опыт, сын ошибок трудных... Fishki.net

Четыре контура — разные основания выбора

Инфраструктура: устойчивые требования и высокая цена переноса среды → заранее согласованные этапы с проверками.

Интерфейс: непроверенный сценарий и еженедельный доступ к пользователям → короткие проверки и уточнение.

Интеграции: отдельные контракты SSO/обмена, внешняя проверка раз в 14 календарных дней → ранние локальные тесты и общие вехи.

Безопасность: обязательные доказательства и неизвестные ошибки реализации → ранняя обратная связь плюс контроль допуска.

Режим — это правила, которые можно проверить

Назовите два определяющих фактора контура.

Укажите горизонт плана, предмет и участника обратной связи.

Свяжите контур с общей проверкой.

Назовите наблюдение, после которого режим пересматривается.

Контрольные точки объединяют контуры

Архитектура подтверждена

Интеграция проверена

Безопасность согласована

Результат готов к опытной эксплуатации

Scrum применяется ТОЛЬКО там, где есть условия

Есть владелец продукта

Команда способна создать приращение

Результат можно проверить

После проверки разрешено менять приоритет

С03: четыре обоснованных режима

Шесть факторов: изменчивость; цена позднего изменения; доступность/ритм обратной связи; зависимости; компетенции; обязательства/проверки.

Четыре строки контуров, в каждой два существенных фактора.

Две связи между контурами и один спорный выбор.

Результат сохраняется на листе С03_Подход.

Контрольные вопросы

Чем итерация отличается от приращения?

Когда гибрид создает двойную бюрократию?

Что делает короткий цикл полезным?

Как регулирование влияет на подход?

Итог: подход следует за риском

Жизненный цикл описывает путь результата

Подход определяет способ движения

Обратная связь имеет цену

Разные контуры могут работать по-разному

Словарь занятия

Жизненный цикл — путь результата от замысла до завершения

Прогнозируемый подход — основной план формируется заранее

Адаптивный подход — план уточняется по результатам коротких циклов

Смешанный подход — разные части проекта управляются по-разному

Вопросы?

